DRE AUVERGNE
VIADUC DE TAULHAC - SOLUTION A (MIXTE)
Planning Général Prévisionnel hors intempéries

Mar 09/03/10
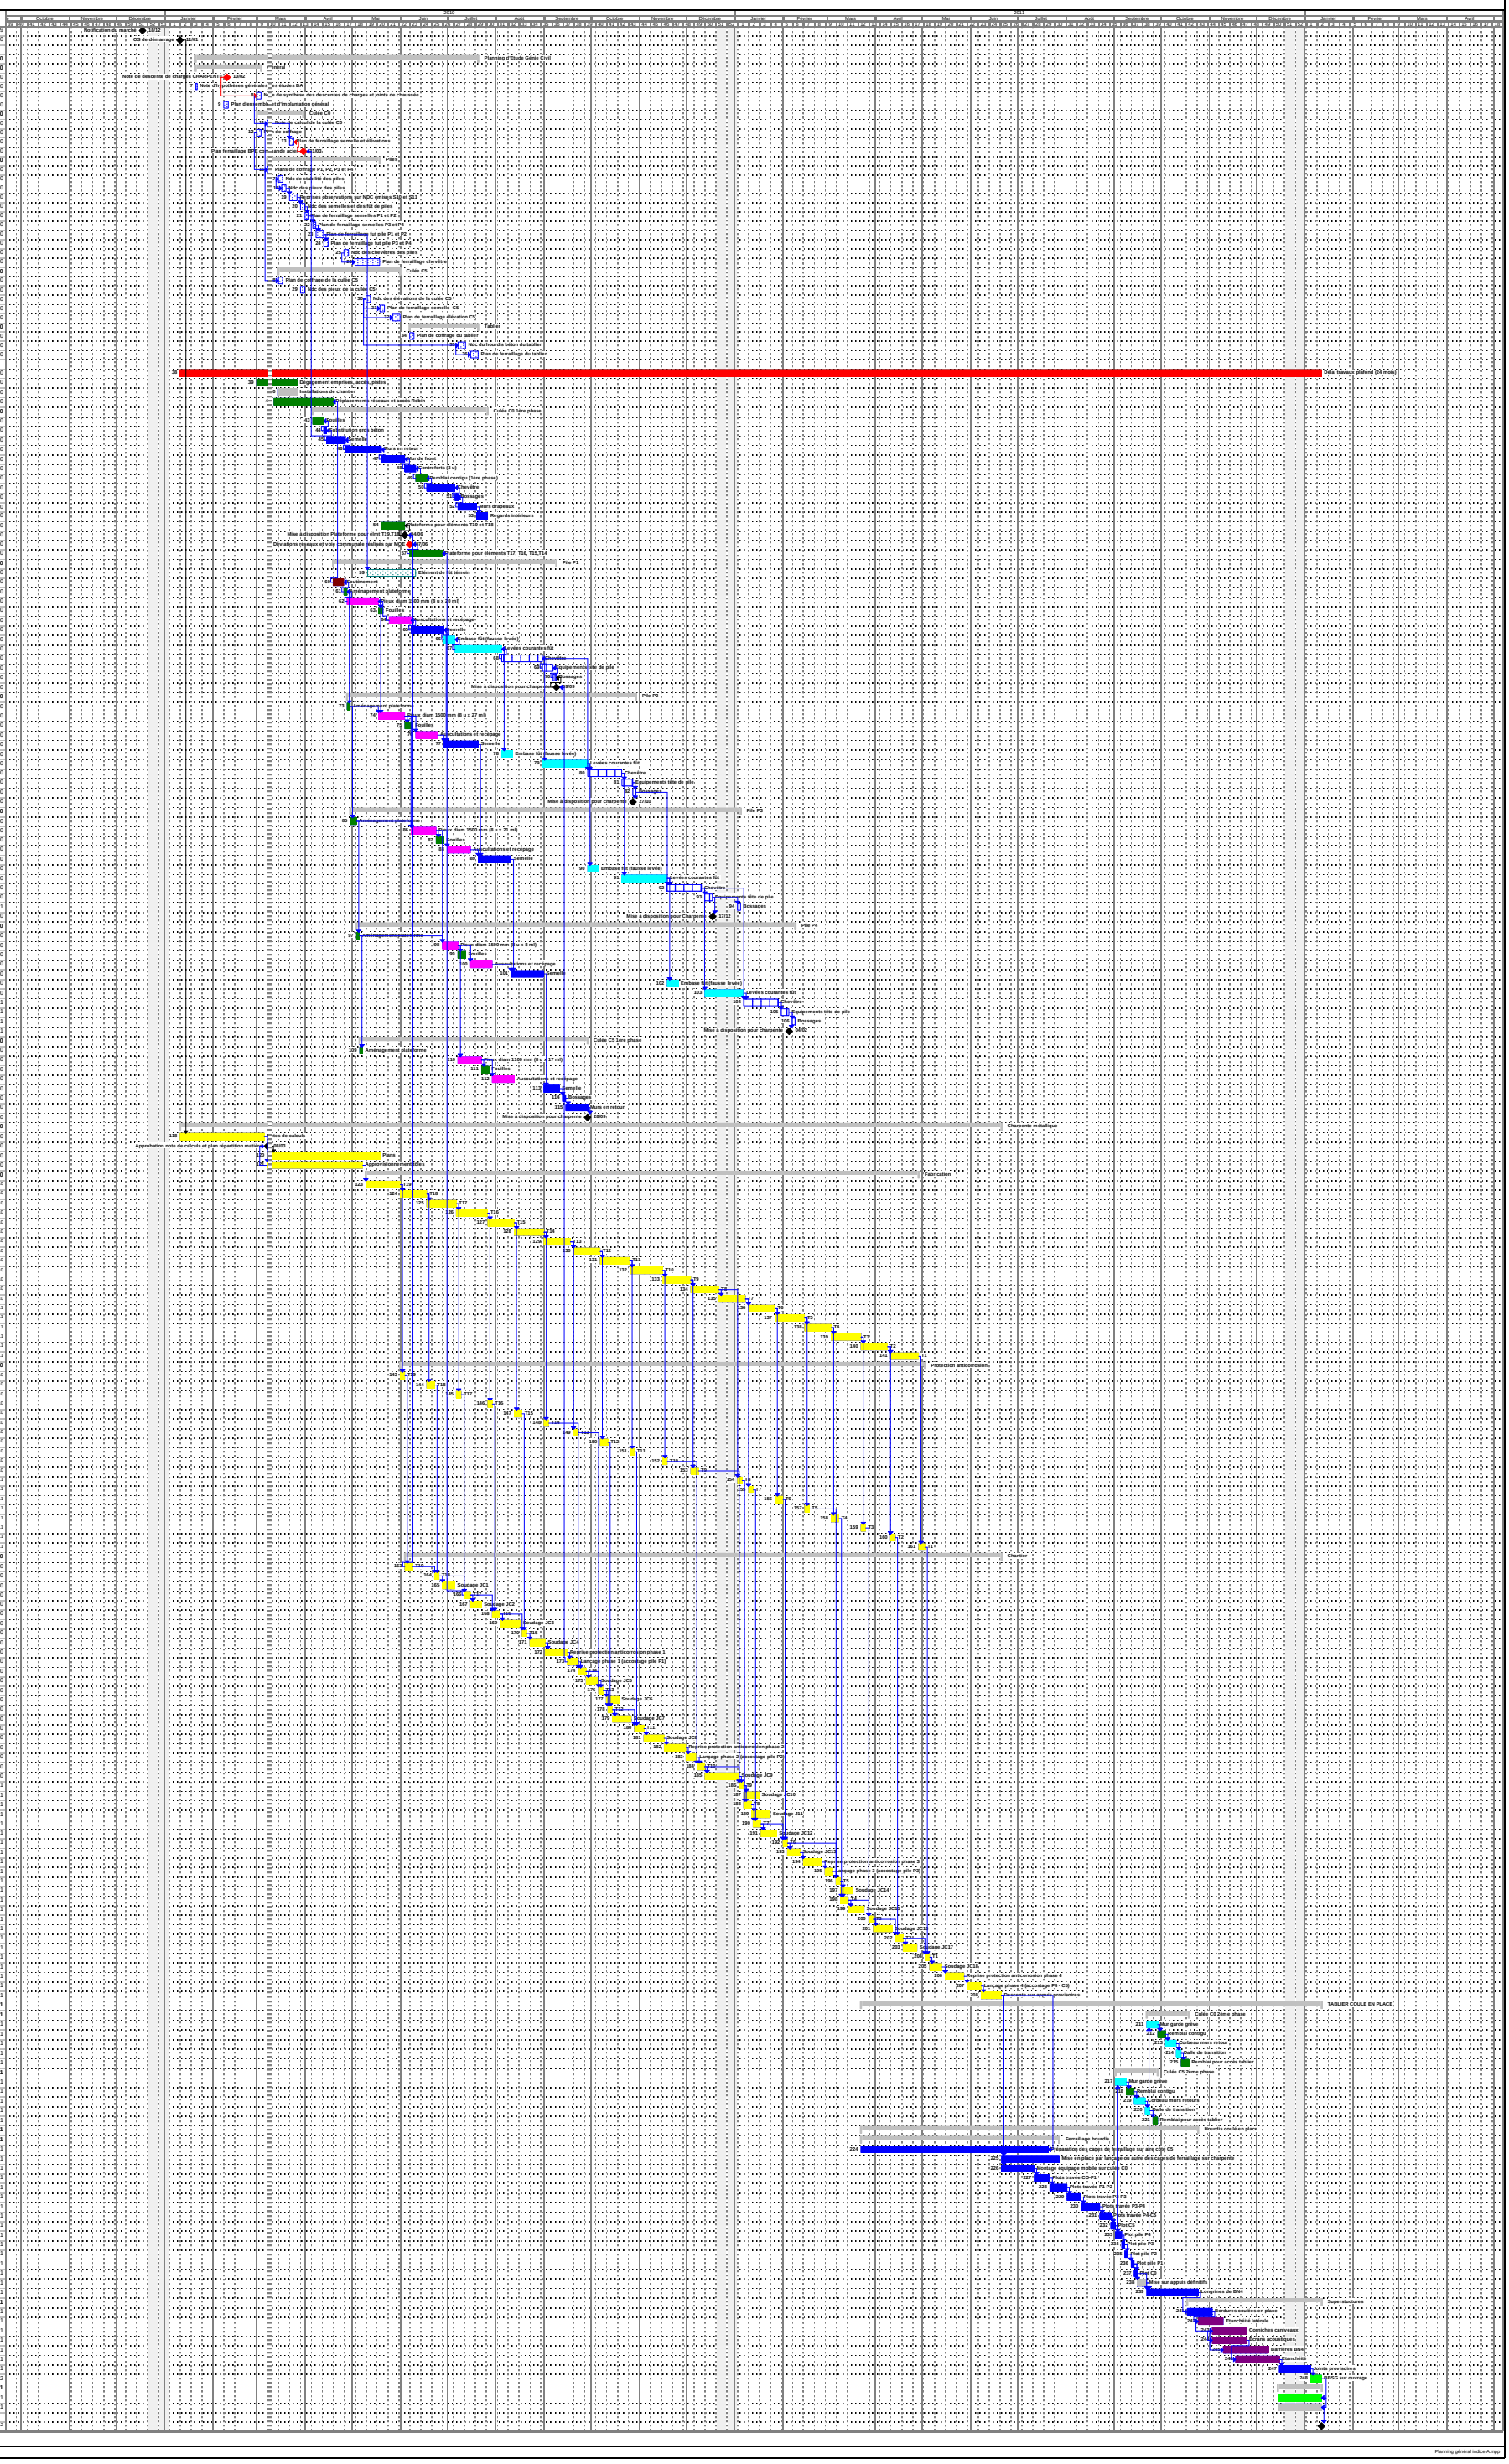
N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	**Notification du marché**	0 jour	Ven 18/12/09
2	**OS de démarrage**	0 jour	Lun 11/01/10
3			
4	**Planning d'Etude Génie Civil**	**124 jours**	**Jeu 21/01/10**
5	**Général**	**30 jours**	**Jeu 21/01/10**
6	Note de descente de charges CHARP	0 jour	Mer 10/02/10
7	Note d'hypothèses générales des étud	1 jour	Jeu 21/01/10
8	Note de synthèse des descentes de ch	3 jours	Lun 01/03/10
9	Plan d'ensemble et d'implantation géné	3 jours	Lun 08/02/10
10	**Cuilée C0**	**22 jours**	**Lun 01/03/10**
11	Note de calcul de la cuilée C0	3 jours	Lun 08/03/10
12	Plan de coffrage	3 jours	Lun 01/03/10
13	Plan de ferraillage semelle et élévation	3 jours	Lun 22/03/10
14	Plan ferraillage BPE commande acier	0 jour	Mer 31/03/10
15	**Piles**	**49 jours**	**Lun 08/03/10**
16	Plans de coffrage P1, P2, P3 et P4	3 jours	Lun 08/03/10
17	Ndc de stabilité des piles	3 jours	Lun 15/03/10
18	Ndc des pieux des piles	3 jours	Mer 17/03/10
19	Reprises observations sur NDC émise	5 jours	Lun 22/03/10
20	Ndc des semelles et des fût de piles	3 jours	Lun 29/03/10
21	Plan de ferraillage semelles P1 et P2	2 jours	Jeu 01/04/10
22	Plan de ferraillage semelles P3 et P4	2 jours	Mar 06/04/10
23	Plan de ferraillage fut pile P1 et P2	3 jours	Jeu 08/04/10
24	Plan de ferraillage fut pile P3 et P4	3 jours	Mar 13/04/10
25	Ndc des chevêtres des piles	3 jours	Lun 26/04/10
26	Plan de ferraillage chevêtre	10 jours	Lun 03/05/10
27	**Cuilée C5**	**52 jours**	**Lun 15/03/10**
28	Plan de coffrage de la cuilée C5	3 jours	Lun 15/03/10
29	Ndc des pieux de la cuilée C5	3 jours	Lun 29/03/10
30	Ndc des élévations de la cuilée C5	3 jours	Lun 10/05/10
31	Plan de ferraillage semelle C5	3 jours	Mer 19/05/10
32	Plan de ferraillage élévation C5	3 jours	Jeu 27/05/10
33	**Tablier**	**31 jours**	**Lun 07/06/10**
34	Plan de coffrage du tablier	3 jours	Lun 07/06/10
35	Ndc du hourdis béton du tablier	3 jours	Jeu 08/07/10
36	Plan de ferraillage du tablier	3 jours	Ven 16/07/10
37			
38	Délai travaux plaiond (24 mois)	485 jours	Lun 11/01/10
39	Dégagement emprises, accès, pistes	20 jours	Lun 01/03/10
40	Installations de chantier	10 jours	Lun 15/03/10
41	Déplacements réseaux et accès Robin	25 jours	Ven 12/03/10
42	**Cuilée C0 1ère phase**	**76 jours**	**Mar 06/04/10**
43	Fouilles	5 jours	Mar 06/04/10
44	Substitution gros béton	2 jours	Mar 13/04/10
45	Semelle	8 jours	Jeu 15/04/10
46	Murs en retour	15 jours	Mar 27/04/10
47	Mur de front	10 jours	Jeu 20/05/10
48	Contreforts (3 u)	5 jours	Ven 04/06/10
49	Remblai contigu (1ère phase)	5 jours	Ven 11/06/10
50	Chevêtre	12 jours	Ven 18/06/10
51	Bossages	2 jours	Mar 06/07/10
52	Murs drapeaux	7 jours	Jeu 08/07/10
53	Regards intérieurs	5 jours	Mar 20/07/10
54	Plateforme pour éléments T19 et T18	10 jours	Jeu 20/05/10
55	Mise à disposition Plateforme pour élmt T	0 jour	Ven 04/06/10
56	Déviations réseaux et voie communale nto	0 jour	Lun 07/06/10
57	Plateforme pour éléments "T17, T16, T15, "	15 jours	Lun 07/06/10
58	**Pile P1**	**99 jours**	**Lun 19/04/10**
59	Elément de fût témoin	20 jours	Mar 11/05/10
60	Soutènement	5 jours	Lun 19/04/10
61	Aménagement plateforme	2 jours	Lun 26/04/10
62	Pieux diam 1500 mm (8 u x 20 ml)	12 jours	Mar 28/04/10
63	Fouilles	3 jours	Mar 18/05/10
64	Auscultations et recépage	10 jours	Mar 25/05/10
65	Semelle	15 jours	Mar 08/06/10
66	Embase fût (fausse levée)	5 jours	Mar 29/06/10
67	Levées courantes fût	21 jours	Mar 06/07/10
68	Chevêtre	18 jours	Jeu 05/08/10
69	Equipements tête de pile	5 jours	Mar 31/08/10
70	Bossages	2 jours	Mar 07/09/10
71	Mise à disposition pour charpente	0 jour	Jeu 09/09/10
72	**Pile P2**	**129 jours**	**Mer 28/04/10**
73	Aménagement plateforme	2 jours	Mer 28/04/10
74	Pieux diam 1500 mm (8 u x 27 ml)	12 jours	Mar 18/05/10
75	Fouilles	3 jours	Ven 04/06/10
76	Auscultations et recépage	10 jours	Ven 11/06/10
77	Semelle	15 jours	Mar 29/06/10
78	Embase fût (fausse levée)	5 jours	Jeu 05/08/10
79	Levées courantes fût	21 jours	Mar 31/08/10
80	Chevêtre	16 jours	Mer 29/09/10
81	Equipements tête de pile	5 jours	Jeu 21/10/10
82	Bossages	2 jours	Jeu 28/10/10
83	Mise à disposition pour charpente	0 jour	Mer 27/10/10
84	**Pile P3**	**161 jours**	**Ven 30/04/10**
85	Aménagement plateforme	2 jours	Ven 30/04/10
86	Pieux diam 1500 mm (8 u x 21 ml)	12 jours	Mar 08/06/10
87	Fouilles	3 jours	Jeu 24/06/10
88	Auscultations et recépage	10 jours	Jeu 01/07/10
89	Semelle	15 jours	Mer 21/07/10
90	Embase fût (fausse levée)	5 jours	Mer 29/09/10
91	Levées courantes fût	18 jours	Jeu 21/10/10
92	Chevêtre	16 jours	Ven 19/11/10
93	Equipements tête de pile	5 jours	Lun 13/12/10
94	Bossages	2 jours	Lun 03/01/11
95	Mise à disposition pour Charpente	0 jour	Ven 17/12/10
96	**Pile P4**	**184 jours**	**Mar 04/05/10**
97	Aménagement plateforme	2 jours	Mar 04/05/10
98	Pieux diam 1500 mm (8 u x 8 ml)	8 jours	Lun 28/06/10
99	Fouilles	3 jours	Jeu 08/07/10
100	Auscultations et recépage	10 jours	Ven 16/07/10
101	Semelle	15 jours	Mer 11/08/10
102	Embase fût (fausse levée)	5 jours	Ven 19/11/10
103	Levées courantes fût	9 jours	Lun 13/12/10
104	Chevêtre	16 jours	Ven 07/01/11
105	Equipements tête de pile	5 jours	Lun 31/01/11
106	Bossages	2 jours	Lun 07/02/11
107	Mise à disposition pour charpente	0 jour	Ven 04/02/11
108	**Cuilée C5 1ère phase**	**100 jours**	**Jeu 06/05/10**
109	Aménagement plateforme	2 jours	Jeu 06/05/10
110	Pieux diam 1100 mm (8 u x 17 ml)	10 jours	Jeu 08/07/10
111	Fouilles	3 jours	Ven 23/07/10
112	Auscultations et recépage	10 jours	Ven 30/07/10
113	Semelle	8 jours	Mer 01/09/10
114	Bossages	2 jours	Lun 13/09/10
115	Murs en retour	10 jours	Mer 15/09/10
116	Mise à disposition pour charpente	0 jour	Mar 28/09/10
117	**Charpente métallique**	**354 jours**	**Lun 11/01/10**
118	Notes de calculs	40 jours	Lun 11/01/10
119	Approbation note de calculs et plan réparti	0 jour	Lun 08/03/10
120	Plans	49 jours	Lun 08/03/10
121	Approvisionnement tôles	44 jours	Lun 08/03/10
122	**Fabrication**	**236 jours**	**Lun 10/05/10**
123	T19	13 jours	Lun 10/05/10
124	T18	13 jours	Mar 01/06/10
125	T17	13 jours	Ven 18/06/10
126	T16	13 jours	Mer 07/07/10
127	T15	13 jours	Mar 27/07/10
128	T14	13 jours	Ven 13/08/10
129	T13	13 jours	Mer 01/09/10
130	T12	13 jours	Lun 20/09/10
131	T11	13 jours	Jeu 07/10/10
132	T10	12 jours	Mar 26/10/10
133	T9	18 jours	Mer 16/11/10
134	T8	18 jours	Sam 04/12/10
135	T7	17 jours	Mer 22/12/10
136	T6	13 jours	Lun 10/01/11
137	T5	13 jours	Jeu 27/01/11
138	T4	13 jours	Mar 15/02/11
139	T3	13 jours	Ven 04/03/11
140	T2	13 jours	Mer 23/03/11
141	T1	13 jours	Lun 11/04/11
142	**Protection anticorrosion**	**225 jours**	**Mar 01/06/10**
143	T19	3 jours	Mar 01/06/10
144	T18	3 jours	Ven 18/06/10
145	T17	3 jours	Mer 07/07/10
146	T16	3 jours	Mar 27/07/10
147	T15	3 jours	Ven 13/08/10
148	T14	3 jours	Mer 01/09/10
149	T13	3 jours	Lun 20/09/10
150	T12	3 jours	Jeu 07/10/10
151	T11	3 jours	Mar 26/10/10
152	T10	3 jours	Mer 16/11/10
153	T9	5 jours	Sam 04/12/10
154	T8	3 jours	Lun 03/01/11
155	T7	3 jours	Lun 10/01/11
156	T6	3 jours	Jeu 27/01/11
157	T5	3 jours	Mar 15/02/11
158	T4	3 jours	Ven 04/03/11
159	T3	3 jours	Mer 23/03/11
160	T2	3 jours	Lun 11/04/11
161	T1	3 jours	Ven 29/04/11
162	**Chantier**	**254 jours**	**Ven 04/06/10**
163	T19	3 jours	Ven 04/06/10
164	T18	3 jours	Mer 23/06/10
165	Soutage JC1	6 jours	Lun 28/06/10
166	T17	3 jours	Lun 12/07/10
167	Soutage JC2	5 jours	Ven 16/07/10
168	T16	3 jours	Ven 30/07/10
169	Soutage JC3	9 jours	Mer 04/08/10
170	T15	3 jours	Mer 18/08/10
171	Soutage JC4	8 jours	Lun 23/08/10
172	Reprise protection anticorrosion phase	10 jours	Jeu 02/09/10
173	Lançage phase 1 (accostage pile P1)	5 jours	Jeu 16/09/10
174	T14	3 jours	Jeu 23/09/10
175	Soutage JC5	6 jours	Mar 28/09/10
176	T13	3 jours	Mer 06/10/10
177	Soutage JC6	6 jours	Lun 11/10/10
178	T12	3 jours	Mar 12/10/10
179	Soutage JC7	8 jours	Ven 15/10/10
180	T11	3 jours	Ven 29/10/10
181	Soutage JC8	7 jours	Jeu 04/11/10
182	Reprise protection anticorrosion phase	14 jours	Mer 17/11/10
183	Lançage phase 2 (accostage pile P2)	5 jours	Mer 01/12/10
184	T10	5 jours	Mer 08/12/10
185	Soutage JC9	6 jours	Lun 13/12/10
186	T9	3 jours	Mar 04/01/11
187	Soutage JC10	10 jours	Ven 07/01/11
188	T8	5 jours	Ven 07/01/11
189	Soutage J11	12 jours	Mer 12/01/11
190	T7	3 jours	Jeu 13/01/11
191	Soutage JC12	8 jours	Mar 18/01/11
192	T6	3 jours	Mar 01/02/11
193	Soutage JC13	6 jours	Ven 04/02/11
194	Reprise protection anticorrosion phase	10 jours	Lun 14/02/11
195	Lançage phase 3 (accostage pile P3)	5 jours	Lun 28/02/11
196	T5	3 jours	Lun 07/03/11
197	Soutage JC14	6 jours	Jeu 10/03/11
198	T4	3 jours	Jeu 10/03/11
199	Soutage JC15	8 jours	Mar 15/03/11
200	T3	3 jours	Lun 28/03/11
201	Soutage JC16	8 jours	Jeu 31/03/11
202	T2	3 jours	Jeu 14/04/11
203	Soutage JC17	6 jours	Mar 19/04/11
204	T1	3 jours	Mar 03/05/11
205	Soutage JC18	6 jours	Ven 06/05/11
206	Reprise protection anticorrosion phase	10 jours	Lun 16/05/11
207	Lançage phase 4 (accostage P4 - C5)	5 jours	Lun 30/05/11
208	Descente sur appuis provisoires	13 jours	Mer 08/06/11
209	**TABLIER COULE EN PLACE**	**191 jours**	**Mer 23/03/11**
210	**Cuilée C0 2ème phase**	**19 jours**	**Jeu 22/09/11**
211	Mur garde grève	5 jours	Jeu 22/09/11
212	Remblai contigu	3 jours	Jeu 29/09/11
213	Corbeau murs retour	5 jours	Mar 04/10/11
214	Dalle de transition	3 jours	Mar 11/10/11
215	Remblai pour accès tablier	3 jours	Ven 14/10/11
216	**Cuilée C5 2ème phase**	**19 jours**	**Ven 02/09/11**
217	Mur garde grève	5 jours	Ven 02/09/11
218	Remblai contigu	3 jours	Ven 09/09/11
219	Corbeau murs retours	5 jours	Mer 14/09/11
220	Dalle de transition	3 jours	Mer 21/09/11
221	Remblai pour accès tablier	3 jours	Lun 26/09/11
222	**Hourdis coulé en place**	**147 jours**	**Mer 23/03/11**
223	**Ferraillage hourdis**	**85 jours**	**Mer 23/03/11**
224	Préparation des cages de ferraillag	80 jours	Mer 23/03/11
225	Mise en place par lançage ou autre	25 jours	Mar 21/06/11
226	Montage équipage mobile sur cuilée C	15 jours	Mar 21/06/11
227	Plots travée C0-P1	6 jours	Mar 12/07/11
228	Plots travée P1-P2	7 jours	Ven 22/07/11
229	Plots travée P2-P3	7 jours	Mar 02/08/11
230	Plots travée P3-P4	7 jours	Jeu 11/08/11
231	Plots travée P4-C5	5 jours	Mar 23/08/11
232	Plot C5	3 jours	Mar 30/08/11
233	Plot pile P4	2 jours	Ven 02/09/11
234	Plot pile P3	2 jours	Mar 06/09/11
235	Plot pile P2	2 jours	Jeu 08/09/11
236	Plot pile P1	2 jours	Lun 12/09/11
237	Plot C0	2 jours	Mer 14/09/11
238	Mise sur appuis définitifs	4 jours	Ven 16/09/11
239	Longrines de BN4	23 jours	Jeu 22/09/11
240	**Superstuctures**	**49 jours**	**Mar 18/10/11**
241	Bordures coulées en place	10 jours	Mar 18/10/11
242	Etanchéité latérale	10 jours	Mar 25/10/11
243	Corniches caniveaux	15 jours	Jeu 03/11/11
244	Ecrans acoustiques	15 jours	Jeu 03/11/11
245	Barrières BN4	20 jours	Jeu 10/11/11
246	Etanchéité	20 jours	Ven 18/11/11
247	Joints provisoires	4 jours	Ven 16/12/11
248	BBSG sur ouvrage	5 jours	Jeu 05/01/12
249	**Travaux annexes**	**10 jours**	**Jeu 15/12/11**
250	Raccordements tablier / chaussée	10 jours	Jeu 15/12/11
251	Repli des installations de chantier	10 jours	Jeu 15/12/11
252			
253	**LIVRAISON**	0 jour	Mer 11/01/12
